


MAPA USTEREK — wyniki audytu naniesione na bryłę kuchni

To NIE jest projekt poprawiony. Czerwone bryły = usterki P0 blokujące zamówienie.

Stan 2026-08-13 (v3.13): sufit zmierzony, lodówka zmierzona, zawiasy rozstrzygnięte — trzy usterki P0 zamknięte. Zostaje 7 usterek P0, koszyk B (decyzje inwestora) oraz dwa pomiary: pilaster i ściana C łańcuchowo.

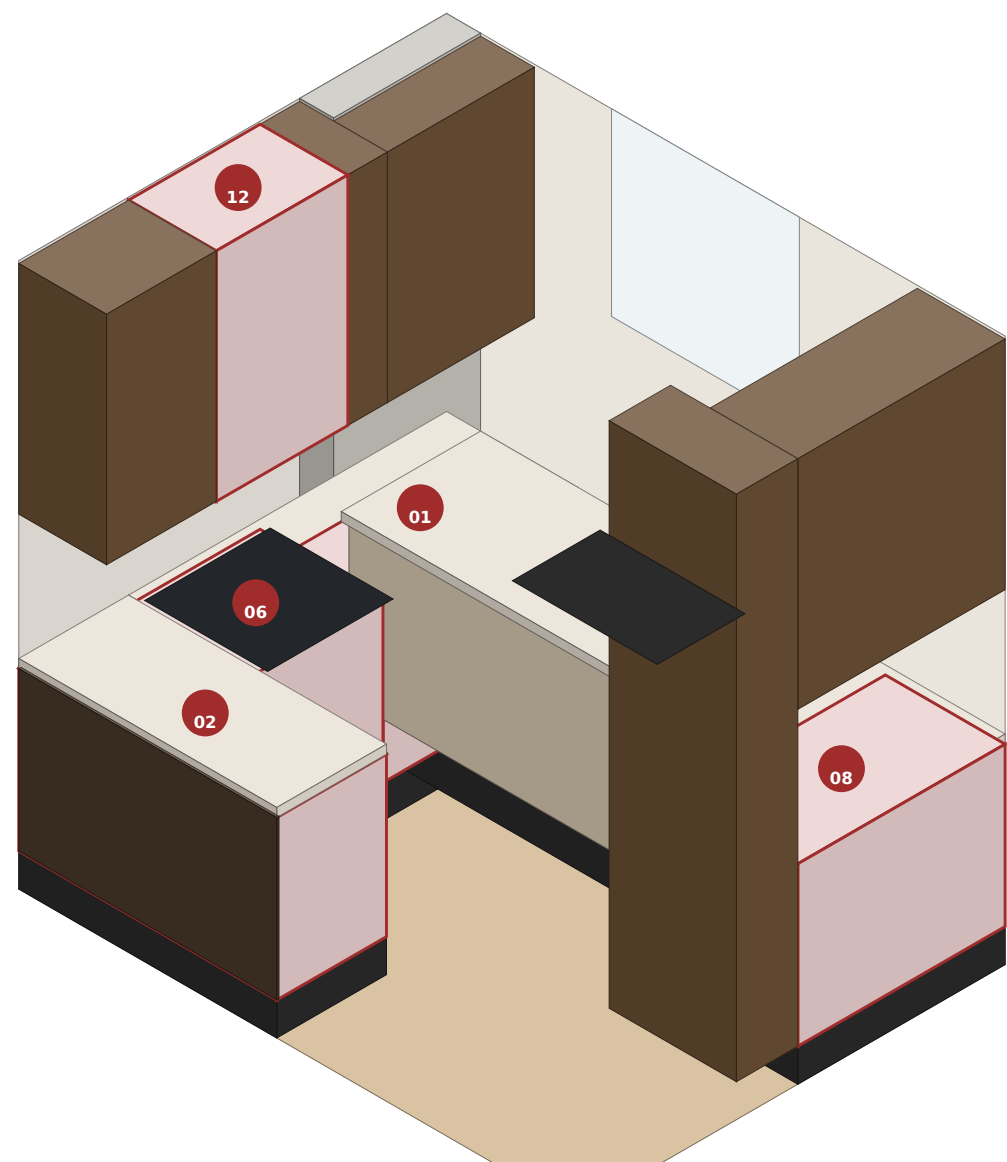

USTERKI P0 — blokują zamówienie

P0-01	DA1 / DC1 / RL1	rozpiska wystawia sztywny front 446 — zamiast 240 / 345 / dzielonego 600
P0-02	RL1 ramię	brak 3 frontów szuflad i 6 den — szuflady na sztućce istnieją tylko w planie
P0-06	DA2	płyta + piekarnik + szuflada nie mieszczą się w pionie (zostaje 68-86 mm)
P0-07	ciąg C	łańcuch nie domyka się: deficyt 2-72 mm (blenda dystansowa JUŻ odpadła — przeliczyć)
P0-08	DC1	cztery różne wymiary w czterech plikach
P0-12	GA3 okap	pełne dno (brak wlotu), brak wylotu recyrkulacji, front 400 na korpusie 989
P0-13	C4 nadstawka	lodówka wolnostojąca nie jest obudową — czym podeprzeć C4? pełne dno vs wentylacja

JUŻ POPRAWIONE NA TYM RYSUNKU (korekty wymuszone arytmetyką, bez decyzji i bez pomiaru)

P0-05	sufit	zmierzony po posadzce: 2481 (min z 2481/2483/2485); fuga 12 → góra zabudowy 2469
P0-03	słupek C2	korpus 2378 → 2319 (2469 – 150 nóżek); inaczej przebijał sufit o 47 mm
P0-04	obudowa lodówki	ODPADA — lodówka wolnostojąca 600×650×2000; nie ma boku 2569,6 do wnoszenia
—	górne A i C	korpus 998 → 989; nadstawka C4 519 → 419 (lodówka 2000, nie 1900)

CZEGO NIE MA NA RYSUNKU I DLACZEGO

- lodówka i nadstawka C4 — pominięte na rysunku, bo zasłaniają wnętrze; usterka P0-13 opisana wyżej
- skorygowane głębokości blatu, fronty gola/frez, zawartość DA2 — to koszyk B, czekają na Twoją decyzję
- pilaster i ściana C — jedyne dwa pomiary, których jeszcze brakuje (reszta wysokości już policzona z 2481)
